


管理画像一覧

印刷日時 2009/12/21 14:10:57


プロジェクト名：行橋市(091203).MGK

動画ファイル名：V1203001.AVI

請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			

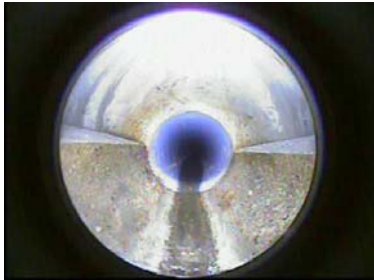

相対時間:5.03[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:5.03[s]
 管理地点：東大橋地区下水管
 地点内容：マンホール入口
 コメント：マンホールへもぐりんこをセットした所

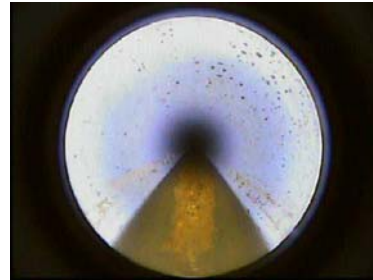

相対時間:10.27[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:10.27[s]
 管理地点：
 地点内容：マンホールから入って直ぐ
 コメント：汚水が溜り始めている




相対時間:65.17[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:65.17[s]
 管理地点：
 地点内容：1本目の途中
 コメント：1本目の中で汚物が一番多いところ

管理画像一覧


印刷日時 2009/12/21 14:10:57

プロジェクト名：行橋市(091203).MGK
 動画ファイル名：V1203001.AVI


請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			

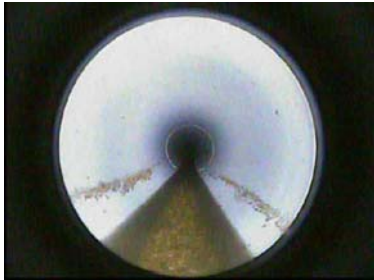

相対時間:83.53[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:83.53[s]
 管理地点：
 地点内容:奥に最初の接続部が見える
 コメント:汚物の量が減っている

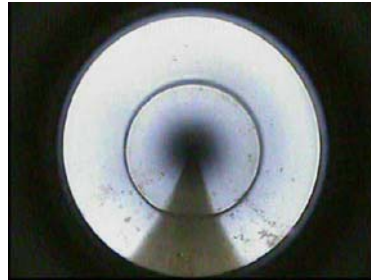

相対時間:85.43[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:85.43[s]
 管理地点：
 地点内容:1本目と2本目の接続部
 コメント:溜まりが少ない

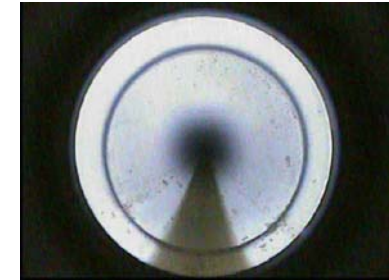


相対時間:85.90[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:85.90[s]
 管理地点：
 地点内容:2本目に入る所
 コメント:汚物の溜まりは殆どない(黒っぽいのは汚水か?)

管理画像一覧

印刷日時 2009/12/21 14:10:57

プロジェクト名：行橋市(091203).MGK
 動画ファイル名：V1203001.AVI

請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			

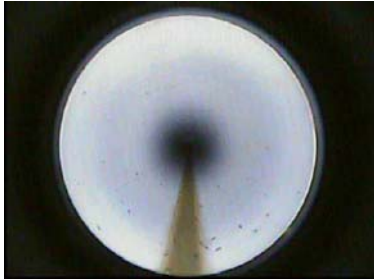

相対時間:131.07[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:131.07[s]
 管理地点：
 地点内容:2本目の途中
 コメント:汚水の溜まりが少ない



相対時間:164.03[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:164.03[s]
 管理地点：
 地点内容:2本目と3本目の接続部
 コメント:接続部は問題なさそう。汚水は若干溜まっている(2本目の途中の方が溜まりは少ない)



相対時間:182.20[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:182.20[s]
 管理地点：
 地点内容:3本目の途中
 コメント:汚水の溜まりが少ない

管理画像一覧


印刷日時 2009/12/21 14:10:57

プロジェクト名：行橋市(091203).MGK
 動画ファイル名：V1203001.AVI


請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			



相対時間:210.83[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:210.83[s]
 管理地点：
 地点内容:3本目から4本目へ
 コメント:接続部は問題なさそう。汚水の溜まりが若干多い

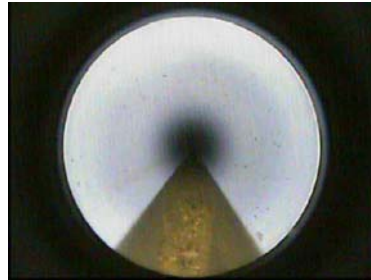

相対時間:217.07[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:217.07[s]
 管理地点：
 地点内容:4本目の途中
 コメント:汚物の溜まりが大分みられる

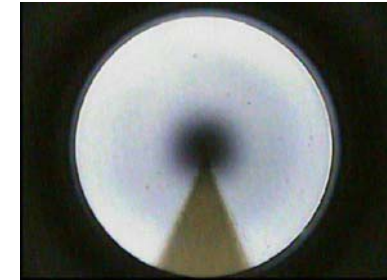


相対時間:227.40[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:227.40[s]
 管理地点：
 地点内容:4本目の奥
 コメント:汚物の溜まりがなくなった

管理画像一覧

印刷日時 2009/12/21 14:10:57

プロジェクト名：行橋市(091203).MGK
 動画ファイル名：V1203001.AVI

請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			

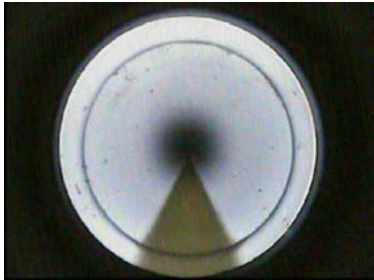

相対時間:233.60[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:233.60[s]
 管理地点：
 地点内容:4本目から5本目へ
 コメント:接続部は問題なさそう。汚水の溜まりが若干ある



相対時間:240.97[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:240.97[s]
 管理地点：
 地点内容:5本目の途中
 コメント:溜まりは殆どない




相対時間:253.30[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:253.30[s]
 管理地点：
 地点内容:5本目から6本目
 コメント:接続部は問題なさそう。汚水の溜まりが若干ある

管理画像一覧


印刷日時 2009/12/21 14:10:57

プロジェクト名：行橋市(091203).MGK
 動画ファイル名：V1203001.AVI


請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			

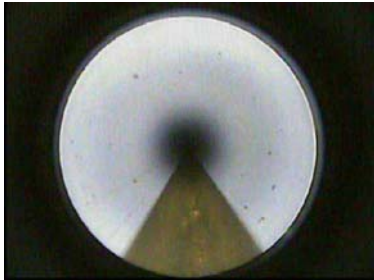

相対時間:264.60[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:264.60[s]
 管理地点:
 地点内容:6本目の途中
 コメント:汚物が若干みられる

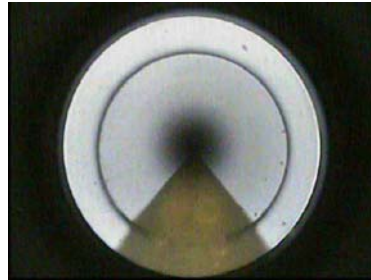

相対時間:281.60[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:281.60[s]
 管理地点:
 地点内容:6本目から7本目
 コメント:汚水の量が結構多い

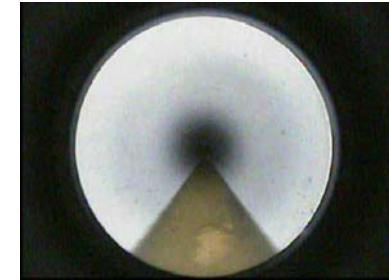

相対時間:292.73[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:292.73[s]
 管理地点:
 地点内容:7本目の途中
 コメント:汚物が汚水中に浮いて見える

管理画像一覧

印刷日時 2009/12/21 14:10:57

プロジェクト名：行橋市(091203).MGK

動画ファイル名：V1203001.AVI

請負業者名				入口時間(s)	0.00
工事名				出口時間(s)	0.00
				管延長(m)	0.00
施工箇所				速度(m/min)	0.00
				管径(mm)	200
		備考			



相対時間:301.87[s] 相対位置:0.00[m] 絶対時間:301.87[s]

管理地点：

地点内容：7本目の途中

コメント：汚物の塊が管壁に付着している
